

# 社会資本総合整備計画事後評価書

令和 8 年 2 月

八千代市上下水道局

【資料一覧】

I. 社会資本総合整備計画 事後評価書

・「八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進  
(防災・安全)」(計画期間:令和3年度～令和6年度)

P2～5

・事業箇所図

P6

II. 社会資本総合整備計画 事後評価書

・「八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進  
(防災・安全)(重点計画)」(計画期間:令和3年度～令和6年度)

P7～10

・事業箇所図

P11

社会資本総合整備計画 事後評価書														令和08年02月02日		
計画の名称	八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進（防災・安全）															
計画の期間	令和03年度 ～ 令和06年度（4年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	八千代市															
計画の目標	下水道施設の更新・長寿命化対策を推進することにより、市民の安心・安全な暮らしの確保を図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		545	A	545	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R6末
1	下水道ストックマネジメント計画に基づき、污水管渠の点検・調査を実施する。			
	污水管渠（幹線及び重要路線）の点検・調査実施率	0%	55%	100%
	点検・調査実施済みの污水管渠延長（m）／点検・調査を予定している污水管渠延長（m）			
2	下水道ストックマネジメント計画に基づき、污水中継ポンプ場の改築工事を実施する。			
	污水中継ポンプ場の改築工事実施率	0%	100%	100%
	改築工事実施済みの污水中継ポンプ場数（箇所）／改築工事を予定している污水中継ポンプ場数（箇所）			
3	下水道施設全体を一体的に捉えた次期下水道ストックマネジメント計画を策定し、計画的な点検・調査、修繕・改築を継続的に推進していく。			
	下水道ストックマネジメント計画策定の進捗率	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八千代市	直接	八千代市	管渠（ 汚水）	改築	汚水管渠改築（下水道ス tockマネジメント計画 ）	実施設計、点検、調査、工事	八千代市	■	■	■	■		156		策定済	
		下水道ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	八千代市	直接	八千代市	ポンプ 場	改築	汚水中継ポンプ場改築（ 下水道ストックマネジメ ント計画）	調査、工事	八千代市	■	■	■			353		策定済	
		下水道ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	八千代市	直接	八千代市	－	－	下水道ストックマネジメ ント計画策定	計画策定	八千代市					■		36		－
		下水道ストックマネジメント																		
											小計							545		
											合計							545		

<div>事後評価</div>	
<div>○事後評価の実施体制、実施時期</div>	
<div>事後評価の実施体制</div> <p>八千代市上下水道事業運営審議会において事後評価を実施。</p>	<div>事後評価の実施時期</div> <p>令和7年12月</p>
	<div>公表の方法</div> <p>八千代市ホームページに公表</p>
<div>○事業効果の発現状況</div>	
<div>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</div>	<p>計画的な下水道施設の点検・調査等を行うことにより、持続的な下水道機能の確保に寄与した。</p>
<div>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</div>	
<div>○特記事項（今後の方針等）</div>	
<p>引き続き計画的な点検・調査等を行うことにより、持続的な下水道機能の確保に努める。</p>	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	汚水管渠（幹線及び重要路線）の点検・調査実施率		
	最 終 目標値	100%	一部の路線の調査を見送ったが、概ね目標値を達成した。
	最 終 実績値	96%	
2	汚水中継ポンプ場の改築工事実施率		
	最 終 目標値	100%	目標値を達成した。
	最 終 実績値	100%	
3	下水道ストックマネジメント計画策定の進捗率		
	最 終 目標値	100%	先行して実施していたポンプの修繕工事に不測の日数を要したことにより、策定が令和7年度となったが、目標どおり計画を策定した。
	最 終 実績値	100%	

# 社会資本総合整備計画

計 画 の 名 称	八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進(防災・安全)		
計 画 の 期 間	令和3年度 ～ 令和6年度 (4年間)	交 付 対 象	八千代市

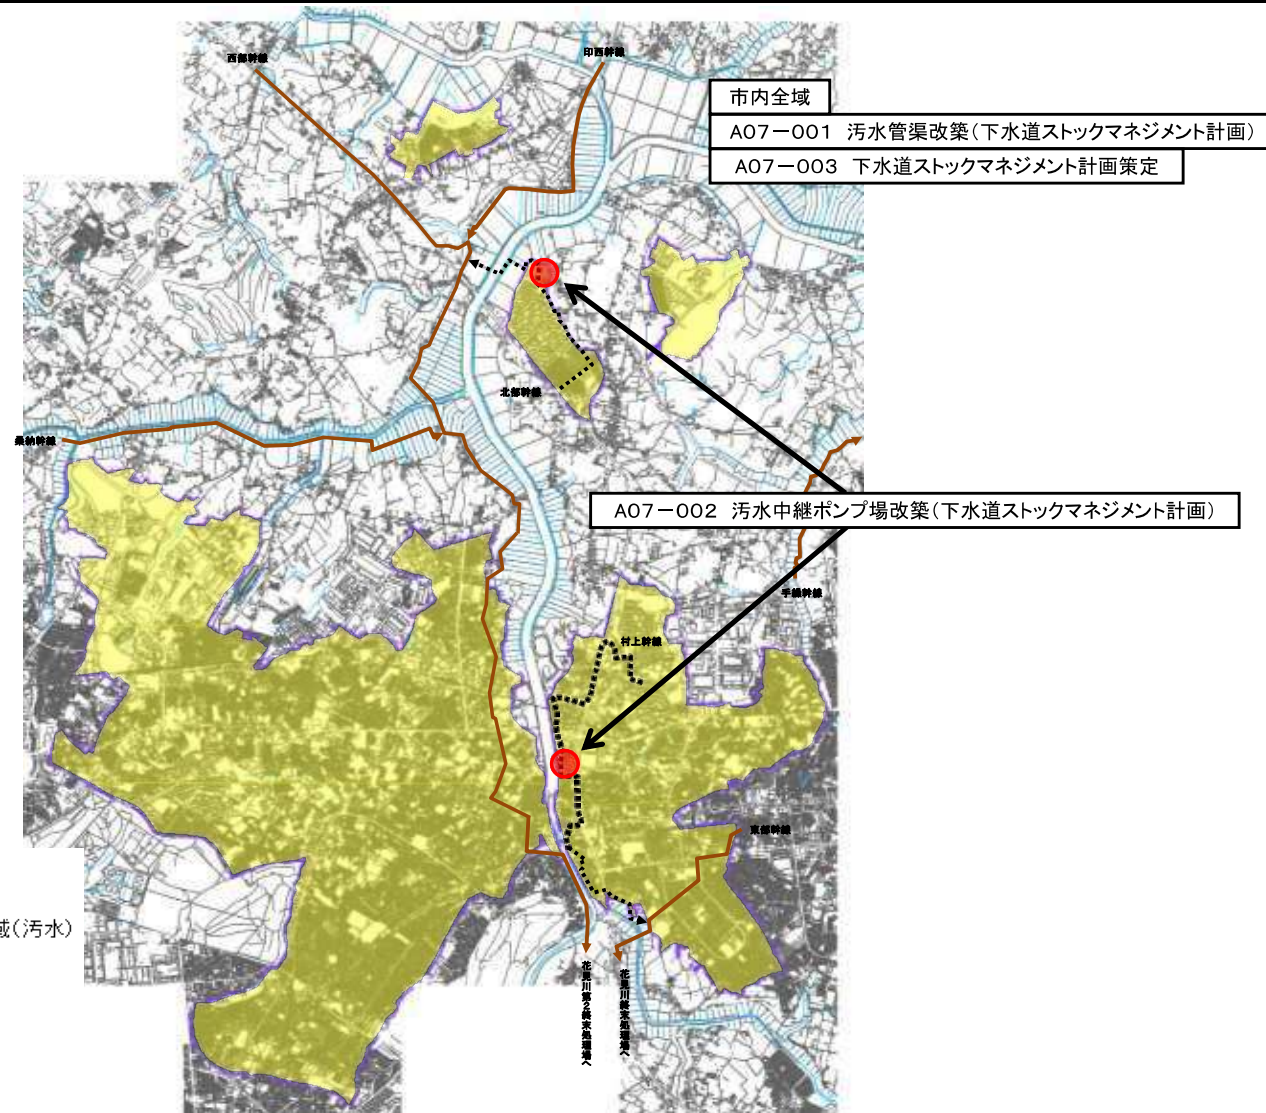

社会資本総合整備計画														事後評価書		令和08年02月02日				
計画の名称	八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進（防災・安全）（重点計画）																			
計画の期間	令和03年度～令和06年度（4年間）												重点配分対象の該当		○					
交付対象	八千代市																			
計画の目標	下水道施設の更新・長寿命化対策並びに雨水管渠等の整備を推進することにより、市民の安心・安全な暮らしの確保を図る。																			
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		265		A	265		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R6末
1	下水道ストックマネジメント計画に基づき、点検・調査を実施した雨水管渠の割合を6%（R3当初）から31%（R6末）に増加させる。			
	雨水管渠の点検・調査実施率	6%	21%	31%
	点検・調査実施済みの雨水管渠延長（m）／点検・調査を実施すべき雨水管渠延長（m）			
2	下水道による都市浸水対策達成率を、43%（R3当初）から44%（R6末）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率	43%	44%	44%
	浸水対策実施済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－




A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八千代市	直接	八千代市	管渠（ 雨水）	改築	雨水管渠改築（下水道ス tockマネジメント計画 ）	点検、調査	八千代市	■	■	■	■		86		策定済	
		下水道ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	八千代市	直接	八千代市	管渠（ 雨水）	新設	八千代 1 号幹線枝線整備 （浸水対策）	管渠整備 L=163m	八千代市		■				179		－	
											小計						265			
												合計						265		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
八千代市上下水道事業運営審議会において事後評価を実施。	令和7年12月
	公表の方法
	八千代市ホームページに公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画的な下水道施設の点検・調査等を行うことにより、持続的な下水道機能の確保に寄与した。</li> <li>・雨水施設の整備を実施することにより、浸水被害の軽減に寄与した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き計画的な点検・調査等を行うことにより、持続的な下水道機能の確保に努める。</li> <li>・浸水対策事業を実施することにより、浸水被害の軽減を図っていく。</li> </ul>	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	雨水管渠の点検・調査実施率		
	最 終 目標値	31%	一部の路線（開渠部）の調査を見送ったため。
	最 終 実績値	21%	
2	下水道による都市浸水対策達成率		
	最 終 目標値	44%	目標値を達成した。
	最 終 実績値	47%	

社会資本総合整備計画

計 画 の 名 称	八千代市における流域一体となった総合的な下水道整備の推進(防災・安全)(重点計画)		
計 画 の 期 間	令和3年度 ～ 令和6年度 (4年間)	交 付 対 象	八千代市

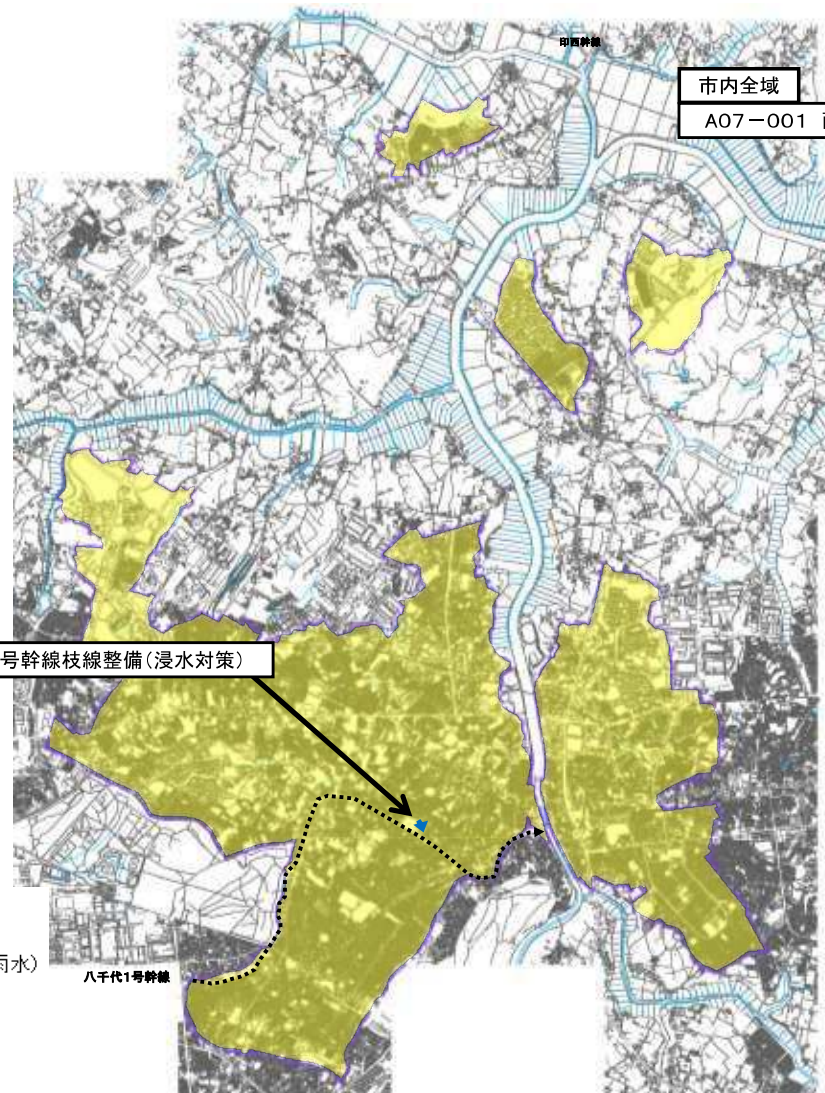

凡例

- 下水道法による事業計画区域(雨水)
- 幹線管渠
- 新設雨水枝線
